

Wloclawek Waste-to-Energy Project


CEO Executive Report - Procurement & Budget Snapshot

Report sintetico ad alta leggibilità, generato dai file Budget e Procurement

 Budget 0 505.343.424 PLN	 Budget Attuale 501.457.853 PLN	 Delta Budgets -3.885.571 PLN	 Delta % -0,8%	 Ordini chiusi ultimi 3 mesi 40	 Prossimi ordini 3 mesi 61	 Milestones penalizzate 4
---	---	---	---	---	---	--

HIGHLIGHTS EXECUTIVE 	 Valore procurement totale 585.490.548 PLN	 Quota già ordinata 37,3%	 Da ordinare 40,7%	 Stato attuale curva S 405,6 mln PLN mag-2026
--	--	--	---	---

Curva S ordini vs pianificato

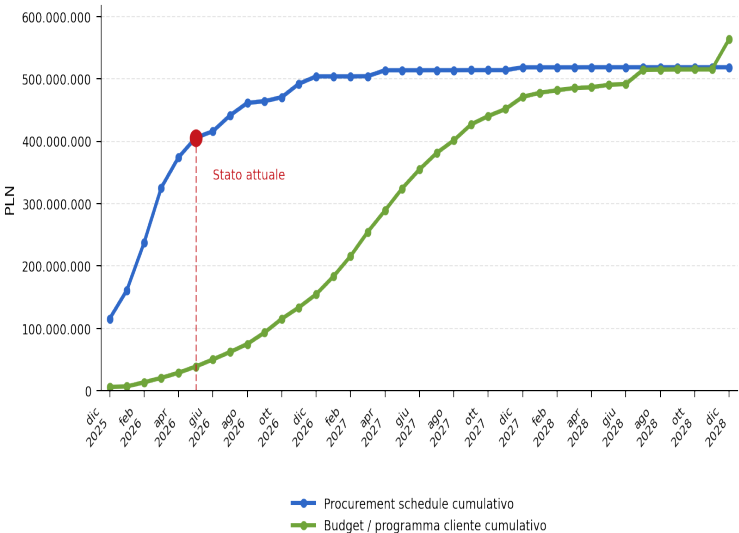

Mix ordini



Produzione annua dichiarata

Anno	Valore (PLN)
2025	6.199.140
2026	134.487.664
2027	300.887.569
2028	59.570.061

Milestones penalizzate

Milestones classificate come penalizzate nel programma milestones

- 1 Water pressure test
- 2 Placement of the turbo-generator on the foundation
- 3 Measurement of guaranteed parameters A
- 4 Handover of the ITPO project to operation



Focus CEO - Messaggi chiave

- ✓ Il budget attuale è inferiore al Budget 0 di 3,9 mln PLN (-0,8%),
- ✓ 37,3% del valore procurement già ordinato; 40,7% ancora da ordinare.
- ✓ Nei prossimi 3 mesi sono previsti 61 ordini, con 40 ordini chiusi negli ultimi 3 mesi.
