

Wloclawek Waste-to-Energy Project

CEO Executive Report - Procurement & Budget Snapshot


Report sintetico ad alta leggibilità, generato dai file Budget e Procurement

 Budget 0 563.911.593 PLN	 Budget Attuale 563.593.205 PLN	 Delta Budgets -318.388 PLN	 % Margine sui costi 11,27%	 Margine 63.492.795 PLN	 Ricavi Base 627.086.000 PLN	 Milestones penalizzate 4
---	---	---	--	--	--	--

HIGHLIGHTS EXECUTIVE 	 Quota già ordinata 52,7%	 Da ordinare 26,5%	 Ordini chiusi ultimi 3 mesi 44	 Prossimi ordini 3 mesi 76	 Stato curva S 324,1 mln PLN mag-2026


Curva S ordini vs pianificato

A - Schedule

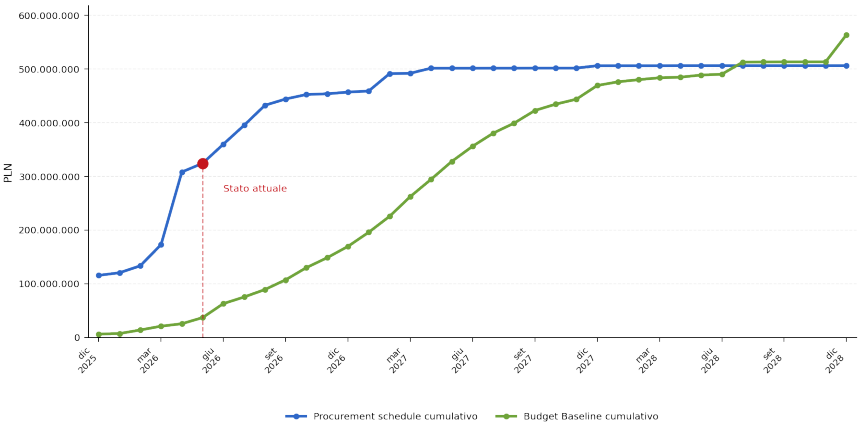

Mix ordini diretti

Solo ordini diretti: root group 1-7

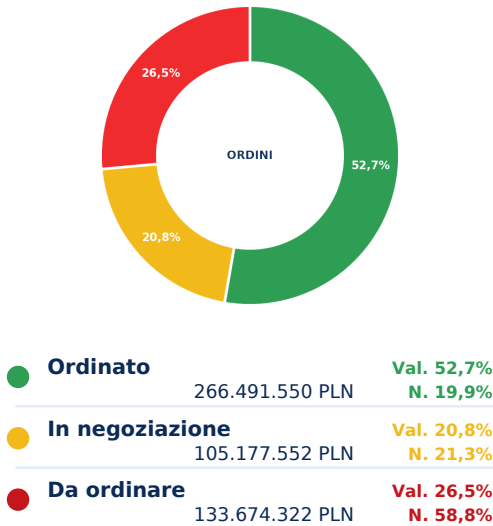

Dettaglio costi diretti

Categoria	Ordinato	Da ordinare*
DESIGN	42.166.000	3.867.000
CIVIL WORKS	39.133.036	72.833.732
ELECTRICAL WORKS	36.086.200	22.259.140
SANITARY WORKS AND F.F.	0	21.293.319
MECHANICAL AND TECHNOLOG...	149.006.314	110.460.332
COMMISSIONING	266.491.550	238.851.874
ALIGNMENT AND BACKUP	0	-261.648

Milestones penalizzate

- 1 Water pressure test
- 2 Placement of the turbo-generator on the foundation
- 3 Measurement of guaranteed parameters A
- 4 Handover of the ITPO project to operation

Focus CEO - Messaggi chiave

- ✓ Qualora l'incremento delle quantità tra basic design e detailed design si mantenesse entro un range contenuto (circa 10%-15%), potrebbe emergere un margine economico aggiuntivo.
- ✓ Priorità CEO: presidiare i pacchetti planned e in negoziazione con maggiore impatto su tempi e costi.
- ✓ Consorzio: PORR 80% e TM.E 20%; reporting e responsabilità da allineare alle quote.
