

Wloclawek Waste-to-Energy Project

CEO Executive Report - Procurement & Budget Snapshot


Report sintetico ad alta leggibilità, generato dai file Budget e Procurement

 Budget 0 563.911.593 PLN	 Budget Attuale 563.593.205 PLN	 Delta Budgets -318.388 PLN	 % Margine sui costi 11,27%	 Margine 63.492.795 PLN	 Ricavi Base 627.086.000 PLN	 Milestones penalizzate 4
---	---	---	--	--	--	--

HIGHLIGHTS EXECUTIVE 	 Quota già ordinata 52,7%	 Da ordinare 26,5%	 Ordini chiusi ultimi 3 mesi 43	 Prossimi ordini 3 mesi 76	 Stato curva S 225,9 mln PLN mag-2026


Curva S ordini vs pianificato

Opzione B

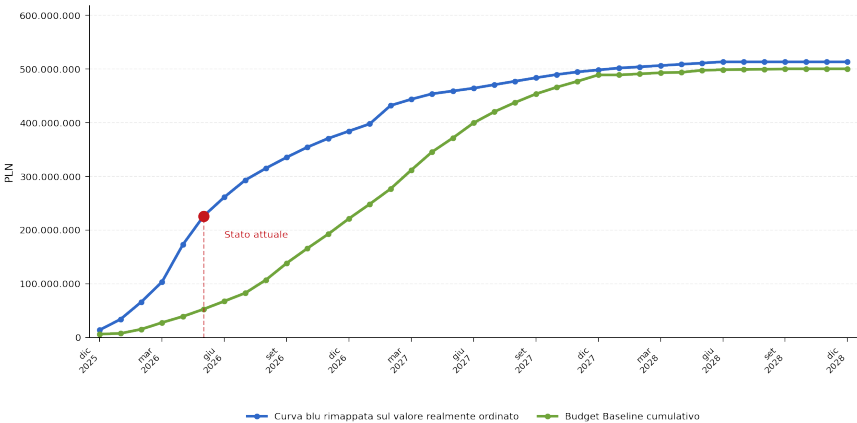

Mix ordini diretti - stato reale

Opzione B: valori reali da Procurement; Ordinato = pacchetti chiusi/ordinati.

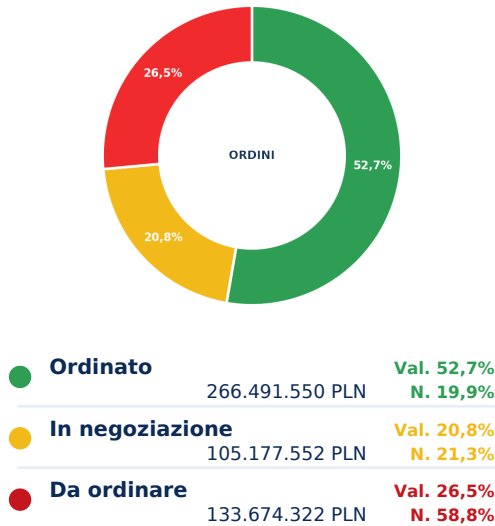

Dettaglio costi diretti

Categoria	Ordinato	Da ordinare*
DESIGN	24.397.974	21.192.026
CIVIL WORKS	33.404.101	74.705.666
ELECTRICAL WORKS	36.070.000	22.275.340
SANITARY WORKS AND F.F.	0	21.293.319
MECHANICAL AND TECHNOLOGIC...	131.227.829	127.438.817
COMMISSIONING	100.000	8.400.000
ALIGNMENT AND BACKUP	726.163	226.618
Totale	225.926.067	275.531.786

*Include planned, enquiry, negotiation e contract prep.

Milestones penalizzate

- Water pressure test
- Placement of the turbo-generator on the foundation
- Measurement of guaranteed parameters A
- Handover of the ITPO project to operation

Focus CEO - Messaggi chiave

- Qualora l'incremento delle quantità tra basic design e detailed design si mantenesse entro un range contenuto (circa 10%-15%), potrebbe emergere un margine economico aggiuntivo.
- Priorità CEO: presidiare i pacchetti planned e in negoziazione con maggiore impatto su tempi e costi.
- Consorzio: PORR 80% e TM.E 20%; reporting e responsabilità da allineare alle quote.
