

Wloclawek Waste-to-Energy Project


CEO Executive Report - Procurement & Budget Snapshot

Report sintetico ad alta leggibilità, generato dai file Budget e Procurement

 Budget 0 563.911.593 PLN	 Budget Attuale 563.593.205 PLN	 Delta Budgets -318.388 PLN	 % Margine sui costi 11,27%	 Margine 63.492.795 PLN	 Ricavi Base 627.086.000 PLN	 Milestones penalizzate 4
---	---	---	--	--	--	--


HIGHLIGHTS EXECUTIVE 	 Quota già ordinata 53,5%	 Da ordinare 46,5%	 Ordini chiusi ultimi 3 mesi 36	 Prossimi ordini 3 mesi 52	 Stato curva S 268,3 mln PLN lug-2026

Curva S ordini vs pianificato

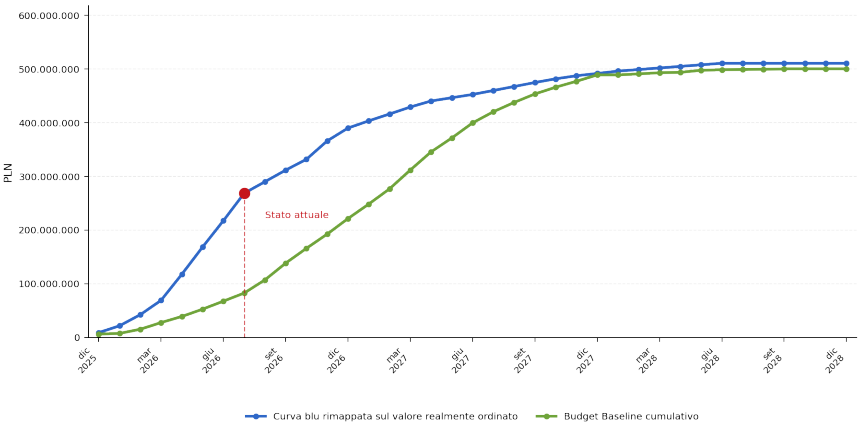

Mix ordini diretti - stato reale

solo ordini diretti - fetta = valore.

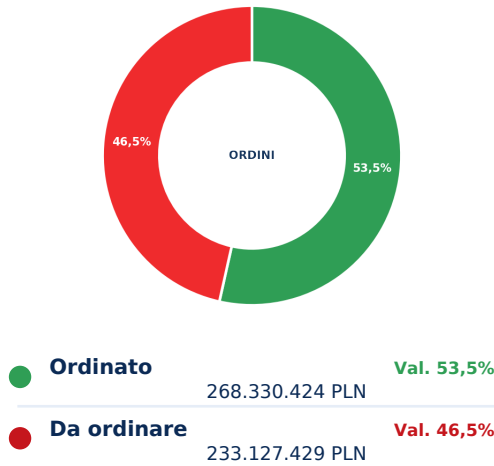

Dettaglio costi diretti

Categoria	Ordinato	Da ordinare*
DESIGN	24.886.974	20.703.026
CIVIL WORKS	53.496.524	54.613.243
ELECTRICAL WORKS	36.070.000	22.275.340
SANITARY WORKS AND F.F.	0	21.293.319
MECHANICAL AND TECHNOLOGIC...	153.053.763	105.612.883
COMMISSIONING	100.000	8.400.000
ALIGNMENT AND BACKUP	723.163	229.618
Totale	268.330.424	233.127.429

*Valori letti dai file ordini / TABLE DASHBOARD.

Milestones penalizzate

- 1 Water pressure test
- 2 Placement of the turbo-generator on the foundation
- 3 Measurement of guaranteed parameters A
- 4 Handover of the ITPO project to operation

Focus CEO - Messaggi chiave

- ✓ Qualora l'incremento delle quantità tra basic design e detailed design si mantenesse entro un range contenuto (circa 10%-15%), potrebbe emergere un margine economico aggiuntivo.
- ✓ Priorità CEO: presidiare i pacchetti planned e in negoziazione con maggiore impatto su tempi e costi.
- ✓ Consorzio: PORR 80% e TM.E 20%; reporting e responsabilità da allineare alle quote.
