

Wloclawek Waste-to-Energy Project


CEO Executive Report - Procurement & Budget Snapshot

Report sintetico ad alta leggibilità, generato dai file Budget e Procurement


 Budget 0 563.911.593 PLN	 Budget Attuale 563.593.205 PLN	 Delta Budgets -318.388 PLN	 % Margine sui costi 11,27%	 Margine 63.492.795 PLN	 Ricavi Base 627.086.000 PLN	 Milestones penalizzate 4
---	---	---	--	--	--	--

HIGHLIGHTS EXECUTIVE 	 Quota già ordinata 52,9%	 Da ordinare 26,7%	 Ordini chiusi ultimi 3 mesi 52	 Prossimi ordini 3 mesi 76	 Stato curva S 106,6 mln PLN mag-2026

Curva S ordini vs pianificato

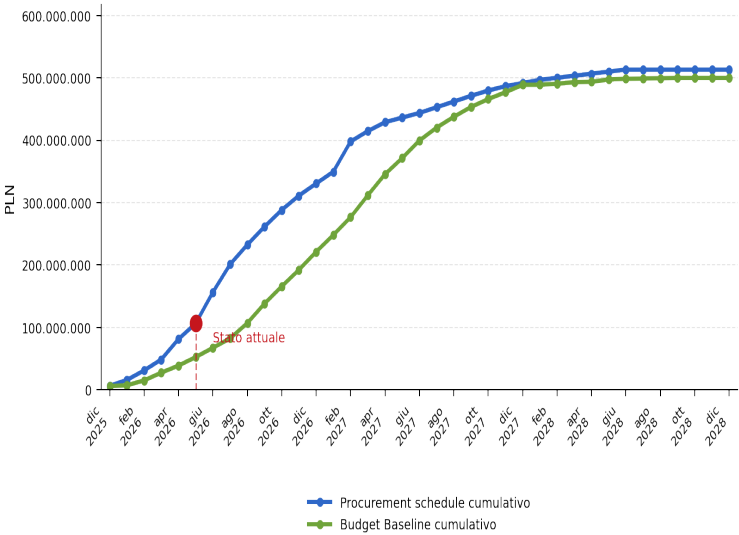

Mix ordini

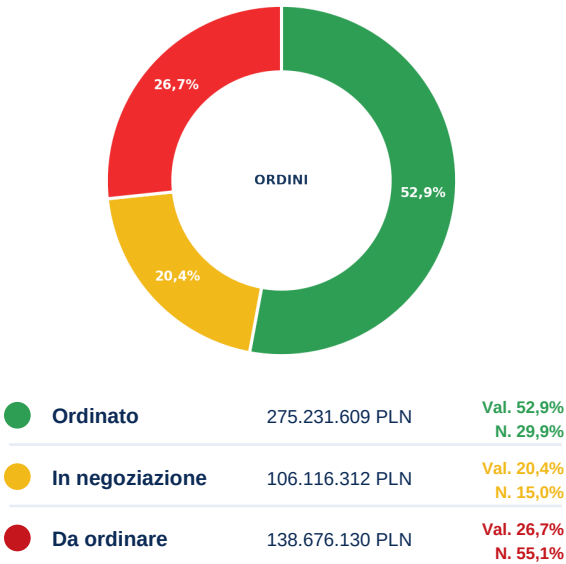

Produzione annua dichiarata

Anno	Valore (PLN)
2025	6.199.140
2026	149.370.973
2027	284.395.943
2028	61.491.797

Milestones penalizzate

- Water pressure test
- Placement of the turbo-generator on the foundation
- Measurement of guaranteed parameters A
- Handover of the ITPO project to operation

Focus CEO - Messaggi chiave

- Qualora l'incremento delle quantità tra basic design e detailed design si mantenesse entro un range contenuto (circa 10%-15%), potrebbe emergere un margine economico aggiuntivo.
- Priorità CEO: presidiare i pacchetti planned e in negoziazione con maggiore impatto su tempi e costi.
- Consorzio: PORR 80% e TM.E 20%; reporting e responsabilità da allineare alle quote.
