

Wloclawek Waste-to-Energy Project


CEO Executive Report - Procurement & Budget Snapshot

Report sintetico ad alta leggibilità, generato dai file Budget e Procurement


 Budget 0 563.911.593 PLN	 Budget Attuale 563.915.105 PLN	 Delta Budgets 3.512 PLN	 % Margine sui costi 11,20%	 Margine 63.170.895 PLN	 Ricavi Base 627.086.000 PLN	 Milestones penalizzate 4
---	---	--	--	--	--	--

HIGHLIGHTS EXECUTIVE 	 Quota già ordinata 42,0%	 Da ordinare 36,0%	 Ordini chiusi ultimi 3 mesi 35	 Prossimi ordini 3 mesi 61	 Stato curva S 167,3 mln PLN mag-2026

Curva S ordini vs pianificato

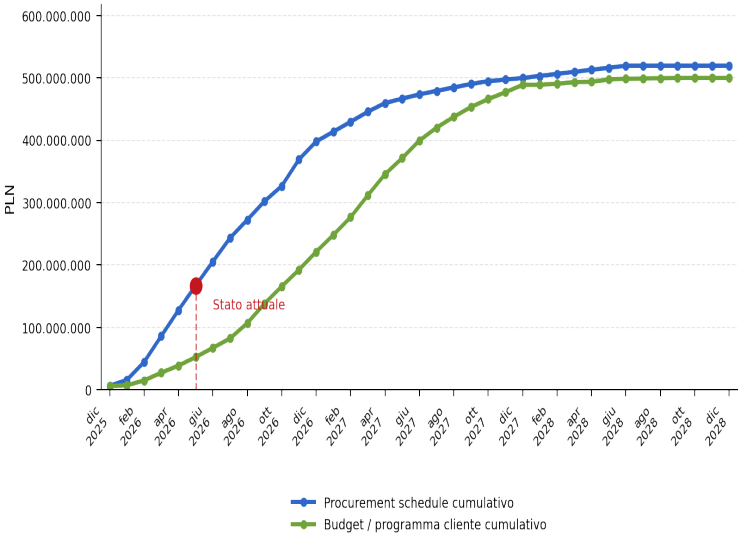

Mix ordini

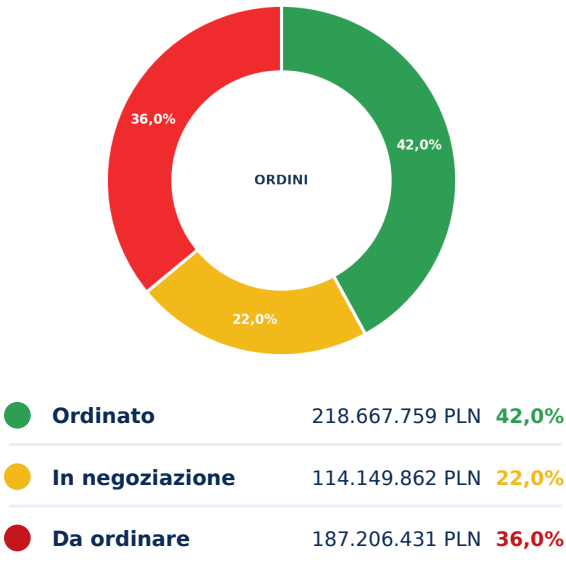

Produzione annua dichiarata

Anno	Valore (PLN)
2025	6.199.140
2026	134.487.664
2027	300.887.569
2028	59.570.061

Milestones penalizzate

- 1 Water pressure test
- 2 Placement of the turbo-generator on the foundation
- 3 Measurement of guaranteed parameters A
- 4 Handover of the ITPO project to operation

Focus CEO - Messaggi chiave

- ✓ Qualora l'incremento delle quantità tra basic design e detailed design si mantenesse entro un range contenuto (circa 10%-15%), potrebbe emergere un margine economico aggiuntivo.
- ✓ Priorità CEO: presidiare i pacchetti planned e in negoziazione con maggiore impatto su tempi e costi.
- ✓ Consorzio: PORR 80% e TM.E 20%; reporting e responsabilità da allineare alle quote.
