

Włocławek Waste-to-Energy Project


CEO Executive Report - Procurement & Budget Snapshot

Report sintetico ad alta leggibilità, generato dai file Budget e Procurement


PLN Budget 0 505.343.424 PLN	Budget Attuale 501.457.853 PLN	Delta Budgets -3.885.571 PLN	% Delta % -0,8%	✓ Ordini chiusi ultimi 3 mesi 40	□ Prossimi ordini 3 mesi 61	! Milestones penalizzate 4
--	---	---	--	---	--	---

HIGHLIGHTS EXECUTIVE	Valore procurement totale 585.490.548 PLN	✓ Quota già ordinata 37,3%	⊙ Da ordinare 40,7%	⚡ Stato attuale curva S 405,6 mln PLN mag-2026
-------------------------------------	--	---	--	--

Curva S ordini vs pianificato

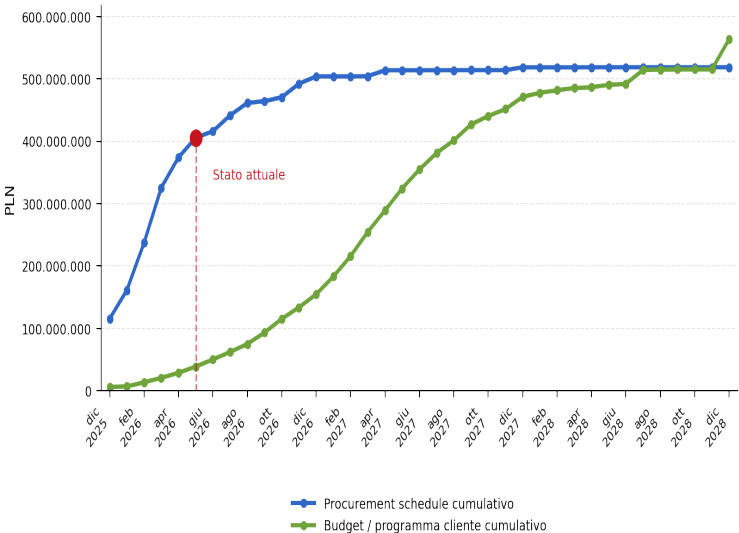

Mix ordini

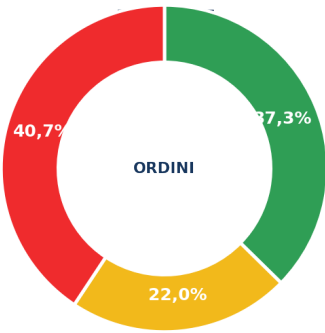

Ordinato	218.667.759 PLN	37,3%
In negoziazione	128.599.286 PLN	22,0%
Da ordinare	238.223.503 PLN	40,7%

Produzione annua dichiarata

Anno	Valore (PLN)
2025	6.199.140
2026	134.487.664
2027	300.887.569
2028	59.570.061

Milestones penalizzate

Milestones classificate come penalizzate nel programma milestones

- Water pressure test
- Placement of the turbo-generator on the foundation
- Measurement of guaranteed parameters A
- Handover of the ITPO project to operation

Focus CEO - Messaggi chiave

- Il budget attuale è inferiore al Budget 0 di 3,9 mln PLN (-0,8%),
- 37,3% del valore procurement già ordinato; 40,7% ancora da ordinare.
- Nei prossimi 3 mesi sono previsti 61 ordini, con 40 ordini chiusi negli ultimi 3 mesi.
