

Wloclawek Waste-to-Energy Project

CEO Executive Report - Procurement & Budget Snapshot

Report sintetico ad alta leggibilità, generato dai file Budget e Procurement



Budget 0

563.911.593
PLN



Budget Attuale

563.915.105
PLN



Delta Budgets

3.512
PLN



% Margine sui costi

11,20%



Ricavi Base

627.086.000
PLN



Milestones penalizzate

4

HIGHLIGHTS
EXECUTIVE
+



Margine

63.170.895



Quota già ordinata

42,0%



Da ordinare

36,0%



Ordini chiusi ultimi 3 mesi

35





Prossimi ordini 3 mesi

61



Stato curva S

167,3 mln PLN
mag-2026

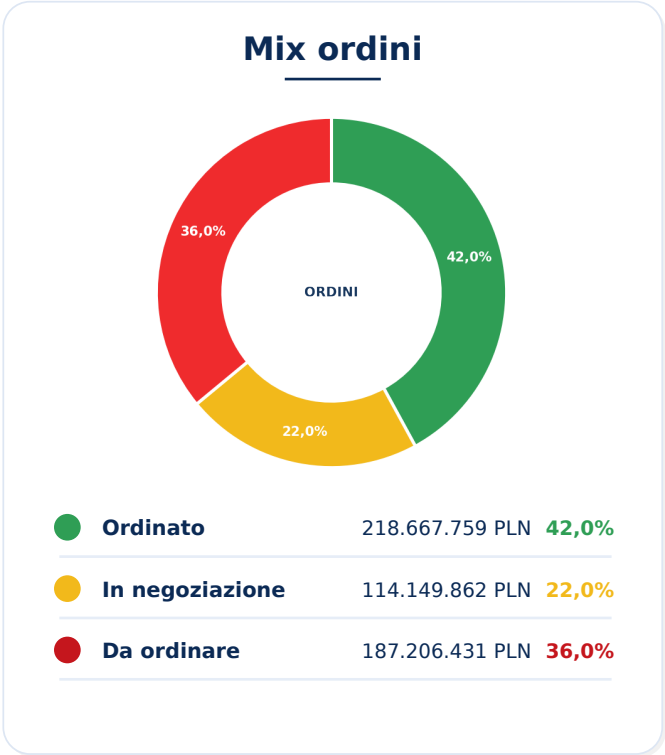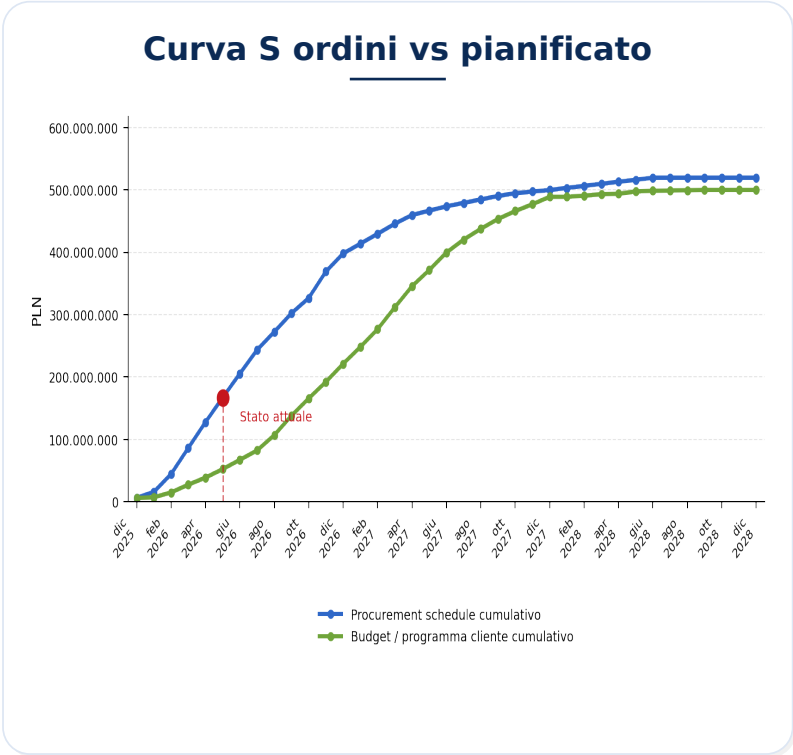

Produzione annua dichiarata

Anno	Valore (PLN)
2025	6.199.140
2026	134.487.664
2027	300.887.569
2028	59.570.061

- ### Milestones penalizzate
- Water pressure test
 - Placement of the turbo-generator on the foundation
 - Measurement of guaranteed parameters A
 - Handover of the ITPO project to operation



Focus CEO - Messaggi chiave

- Qualora l'incremento delle quantità tra basic design e detailed design si mantenesse entro un range contenuto (circa 10%-15%), potrebbe emergere un margine economico aggiuntivo.
- Priorità CEO: presidiare i pacchetti planned e in negoziazione con maggiore impatto su tempi e costi.
- Consorzio: PORR 80% e TM.E 20%; reporting e responsabilità da allineare alle quote.
