

Wloclawek Waste-to-Energy Project


CEO Executive Report - Procurement & Budget Snapshot

Report sintetico ad alta leggibilità, generato dai file Budget e Procurement

 Budget 0 563.911.593 PLN	 Budget Attuale 563.593.205 PLN	 Delta Budgets -318.388 PLN	 % Margine sui costi 11,27%	 Margine 63.492.795 PLN	 Ricavi Base 627.086.000 PLN	 Milestones penalizzate 4
---	---	---	--	--	--	--


HIGHLIGHTS EXECUTIVE 	 Quota già ordinata 52,7%	 Da ordinare 26,5%	 Ordini chiusi ultimi 3 mesi 45	 Prossimi ordini 3 mesi 76	 Stato curva S 106,6 mln PLN mag-2026

Curva S ordini vs pianificato

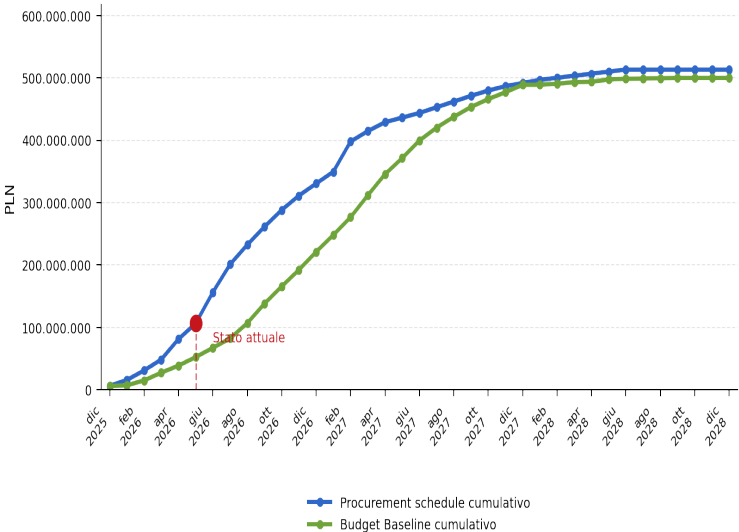

Mix ordini diretti

Solo ordini diretti: root group 1-7

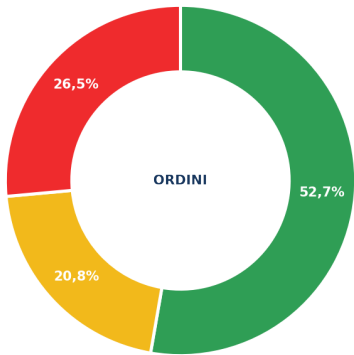

 Ordinato	266.491.550 PLN	Val. 52,7% N. 18,3%
 In negoziazione	105.177.552 PLN	Val. 20,8% N. 18,7%
 Da ordinare	133.674.322 PLN	Val. 26,5% N. 63,0%

Produzione annua dichiarata

Anno	Valore (PLN)
2025	6.199.140
2026	149.370.973
2027	284.395.943
2028	61.491.797

Milestones penalizzate

- 1 Water pressure test
- 2 Placement of the turbo-generator on the foundation
- 3 Measurement of guaranteed parameters A
- 4 Handover of the ITPO project to operation

Focus CEO - Messaggi chiave

- ✓ Qualora l'incremento delle quantità tra basic design e detailed design si mantenesse entro un range contenuto (circa 10%-15%), potrebbe emergere un margine economico aggiuntivo.
- ✓ Priorità CEO: presidiare i pacchetti planned e in negoziazione con maggiore impatto su tempi e costi.
- ✓ Consorzio: PORR 80% e TM.E 20%; reporting e responsabilità da allineare alle quote.
