

Wloclawek Waste-to-Energy Project

CEO Executive Report - Procurement & Budget Snapshot

Report sintetico ad alta leggibilità, generato dai file Budget e Procurement



Budget 0

563.911.593
PLN



Budget Attuale

563.915.105
PLN



Delta Budgets

3.512
PLN



% Margine sui costi

11,20%



Ricavi Base

627.086.000
PLN



Milestones penalizzate

4

HIGHLIGHTS EXECUTIVE





Margine

63.170.895



Quota già ordinata

42,0%



Da ordinare

36,0%



Ordini chiusi ultimi 3 mesi

35






Prossimi ordini 3 mesi

61



Stato curva S

167,3 mln PLN mag-2026

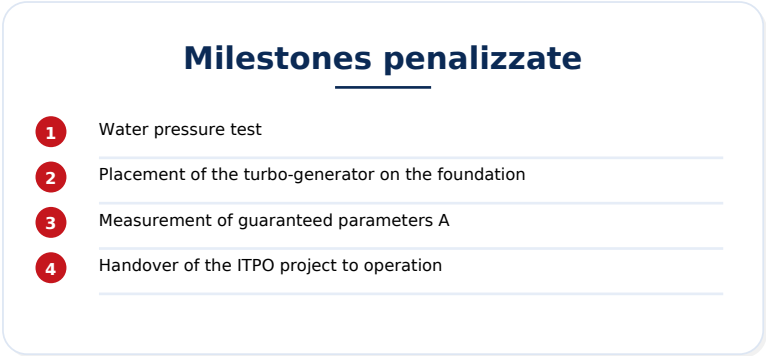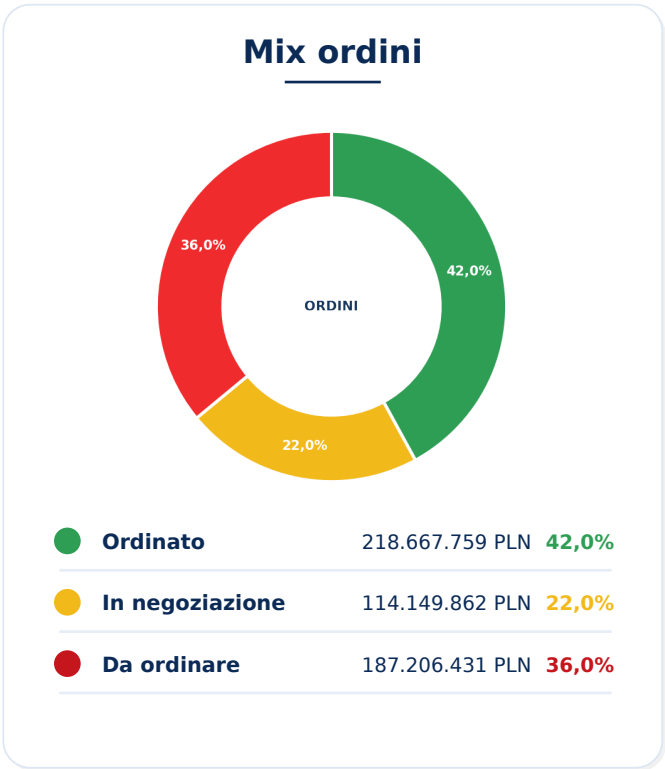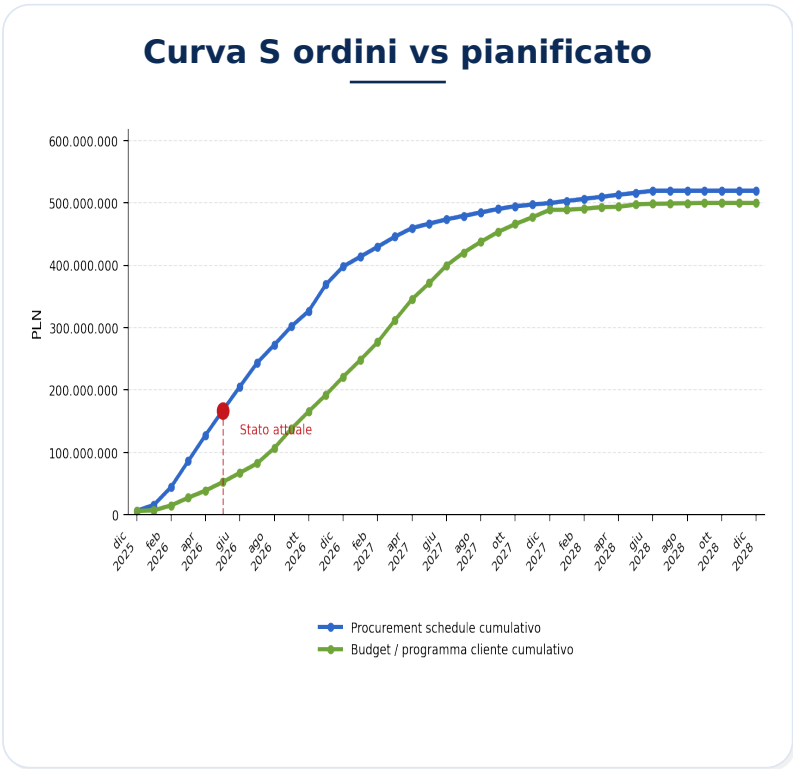



Focus CEO - Messaggi chiave

- Budget e marginalità sono letti dal Budget aggiornato: TKW Razem, Ricavi Base e Margine.
- Priorità CEO: presidiare i pacchetti planned e in negoziazione con maggiore impatto su tempi e costi.
- Consorzio: PORR 80% e TM.E 20%; reporting e responsabilità da allineare alle quote.
