

# Wloclawek Waste-to-Energy Project


## CEO Executive Report - Procurement & Budget Snapshot

Report sintetico ad alta leggibilità, generato dai file Budget e Procurement


|                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Budget 0</b><br><b>563.911.593</b><br>PLN | <br><b>Budget Attuale</b><br><b>563.593.205</b><br>PLN | <br><b>Delta Budgets</b><br><b>-318.388</b><br>PLN | <br><b>% Margine sui costi</b><br><b>11,27%</b> | <br><b>Margine</b><br><b>63.492.795</b><br>PLN | <br><b>Ricavi Base</b><br><b>627.086.000</b><br>PLN | <br><b>Milestones penalizzate</b><br><b>4</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                  |                                                                                                                                |                                                                                                                         |                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>HIGHLIGHTS EXECUTIVE</b><br> | <br><b>Quota già ordinata</b><br><b>52,9%</b> | <br><b>Da ordinare</b><br><b>26,7%</b> | <br><b>Ordini chiusi ultimi 3 mesi</b><br><b>52</b> | <br><b>Prossimi ordini 3 mesi</b><br><b>76</b> | <br><b>Stato curva S</b><br><b>106,6</b><br>mln PLN mag-2026 |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                |                                                                                                                         |                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                |                                                                                                                         |                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |

### Curva S ordini vs pianificato

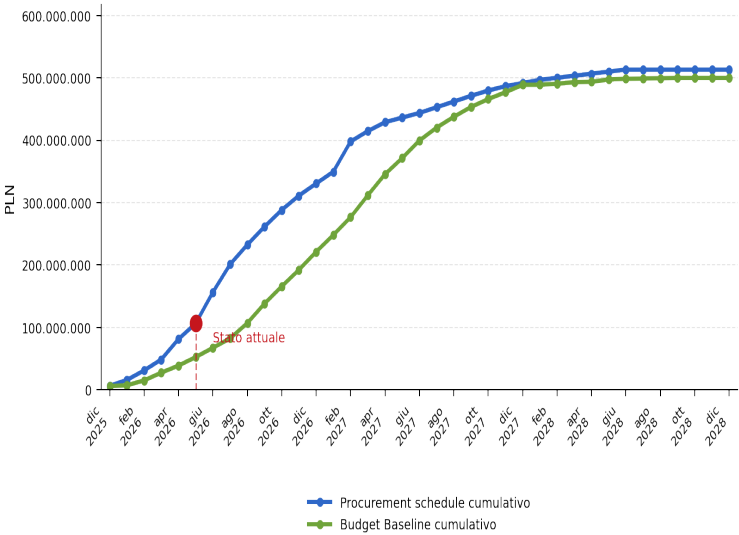

### Mix ordini

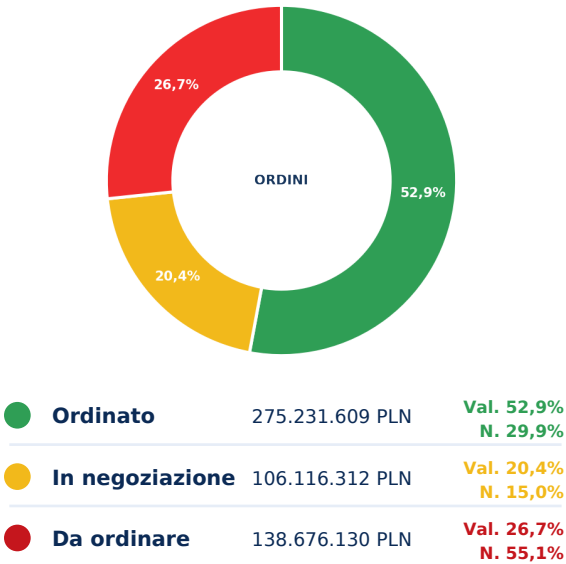

### Produzione annua dichiarata

| Anno | Valore (PLN) |
|------|--------------|
| 2025 | 0            |
| 2026 | 0            |
| 2027 | 0            |
| 2028 | 0            |

### Milestones penalizzate

- Water pressure test
- Placement of the turbo-generator on the foundation
- Measurement of guaranteed parameters A
- Handover of the ITPO project to operation

### Focus CEO - Messaggi chiave

- Qualora l'incremento delle quantità tra basic design e detailed design si mantenesse entro un range contenuto (circa 10%-15%), potrebbe emergere un margine economico aggiuntivo.
- Priorità CEO: presidiare i pacchetti planned e in negoziazione con maggiore impatto su tempi e costi.
- Consorzio: PORR 80% e TM.E 20%; reporting e responsabilità da allineare alle quote.
